


La deuxième et dernière tranche des travaux de sécurisation permet de stabiliser l'évolution des dégradations avant d'engager la démarche de réhabilitation totale du monument.

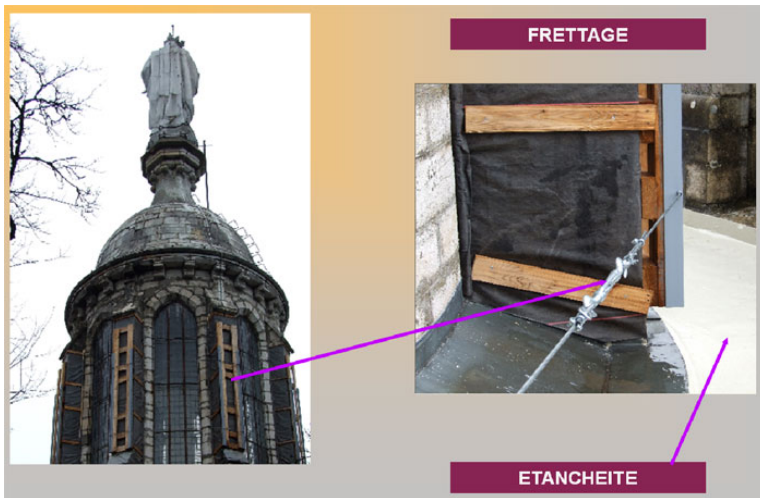

Ont été réalisés :

- l'étanchéité du chemin de ronde : elle stoppe les infiltrations et par conséquent permet d'éviter l'effritement des pierres par le gel
- le cerclage des 8 contreforts de la tour lanterne : il amorti les forces latérales dues aux effets du vent sur la statue

{backbutton}
